




Planer for rehabilitering av vann- og avløpsanlegg i Konnerudgata (strekning Gamlebakken – ”Fabrikkutsalget”)

Bakgrunn for planleggingen:

- Gammel vannledning fra 1925 representerer forhøyet risiko for avbrudd i tilførsel av drikkevann og brannvann – ingen rundkjøring.
- Svært dårlige felleskummer for vann- og avløpsledningene.
- Gammel avløpsledning – fellesledning. Ønskelig med separering av overvann og avløp.

Konnerudgata, VA-anlegg

Området som skal analyseres

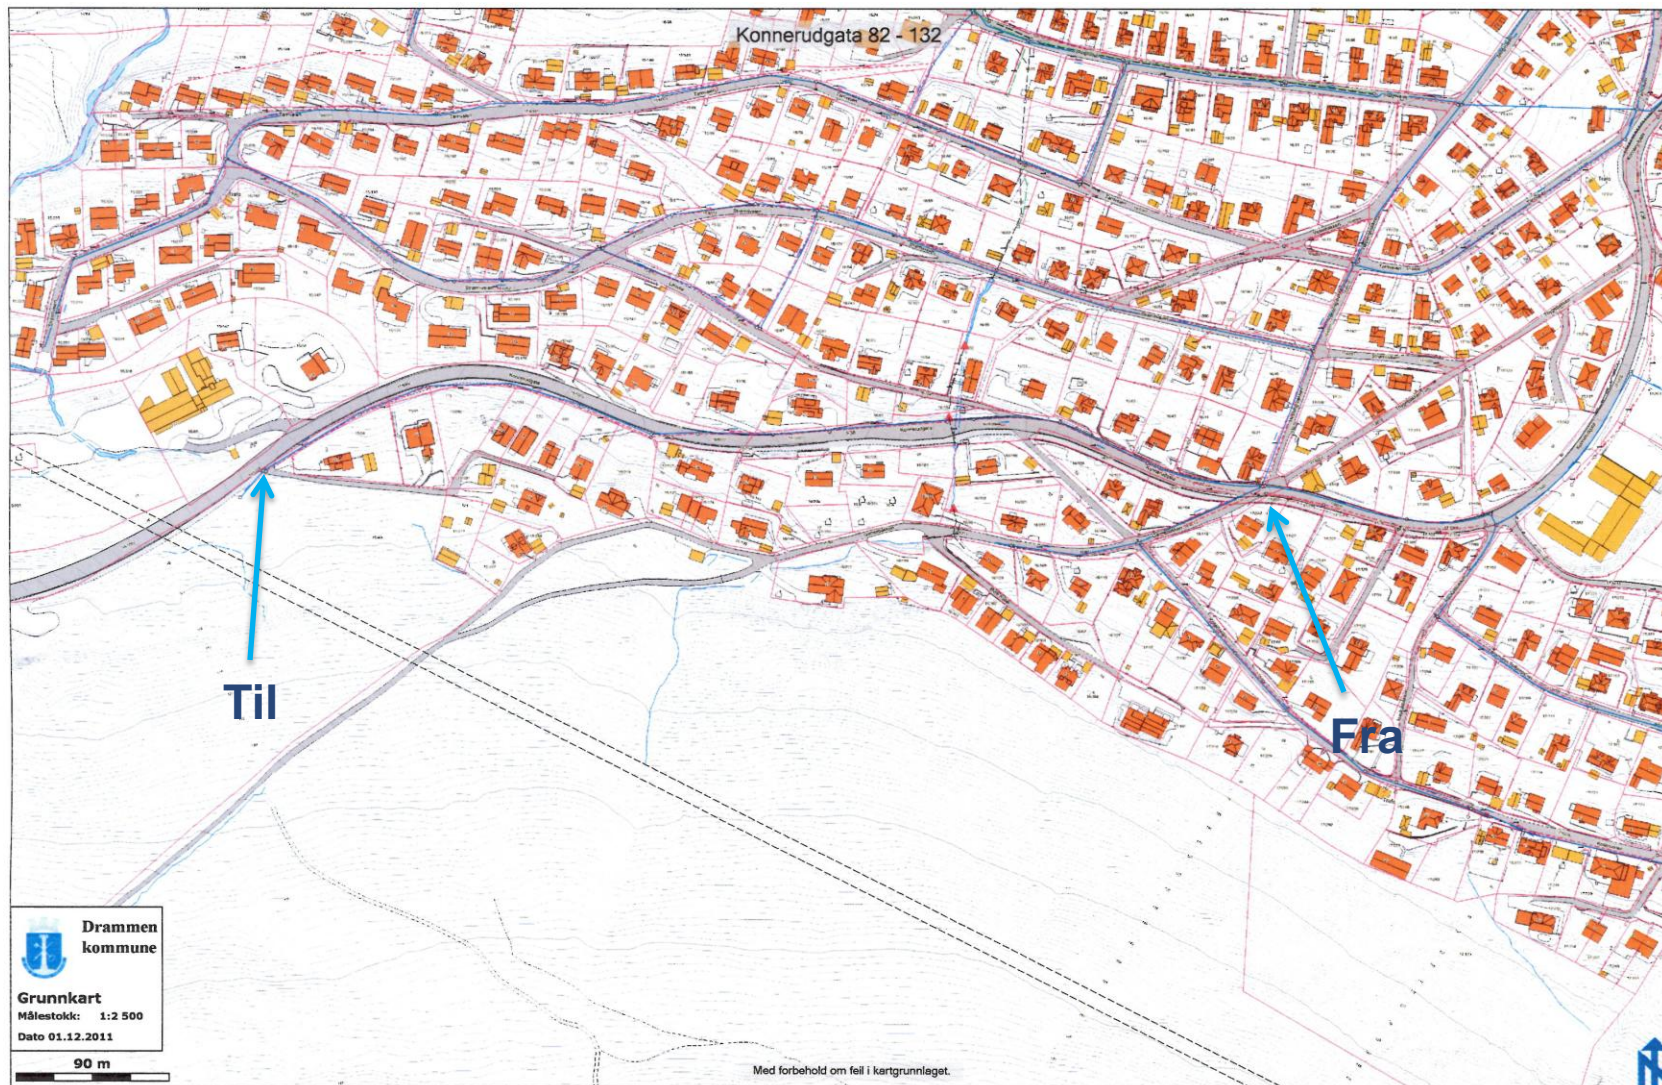

Kartlegging

- Kartlegge ledningenes tilstand - nødvendig med rehabilitering nå?
- Alternative metoder for rehabilitering vurderes
 - NODIG - metoder for å begrense omfanget av graving i vei.
 - Utskifting av ledninger ved graving
 - Plassering av ledningstrase (veg eller gang-/sykkelvei)
 - Eksisterende kummer må uansett graves opp og erstattes.
- Grunnboringer utføres 3. og 4. januar for å avklare grunnforholdene på strekningen (jord/fjell). Boringene må gjennomføres om natta på grunn av trafikkavvikling. Beboere vil bli informert om arbeidene.

Planlegging/gjennomføring

Gitt at rehabilitering er nødvendig:

- For å hindre trafikkavviklingen i minst mulig grad, planlegges arbeidene utført i perioden med minst trafikk - dvs. sommerferien. Mulig at dette medfører at arbeidene må utføres over to år.
- Anleggsstart sommeren 2012
- Det er gjennomført koordineringsmøter med Statens vegvesen, Nettbuss, Buskerud kollektivtrafikk og politiet.



DRAMMEN
KOMMUNE
