



Hovedutvalg helse, sosial og omsorg

4. mai 2023

Kort om prosjektet



Resultat mål

- Oppnå et mer differensiert og fremtidsrettet bolig- og tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, der det blir lagt godt til rette for brukermedvirkning.
- Utviklet 2-3 nye boformer, som blir beskrevet i bolig- og tjenestetrappen.
- De forskjellige boformene er kjent, både for de ansatte i kommunen, brukere og pårørende.

Linjeorganisasjonen vil samtidig jobbe kontinuerlig med de kortsiktige behovene som må dekkes underveis.

Gevinst /Effekt

- Ved å gjennomføre prosjektet blir det et større søkelys på tjenestene vs. boligen, samt bedre bruk av eksisterende personalressurser og bedre kontroll på fremtidens behov.
- Effekten kan knyttes tett opp mot kommunens strategiske mål, temaplaner og handlings og økonomiplanen, der utvikling av en mer bærekraftig- og kostnadseffektiv tjeneste er i fokus.

Strategisk forankring

Prosjektets mål og resultat er godt forankret i Drammen kommune sin Handlings- og økonomiplan 2023-2026. Innenfor satsningsområde deltagende innbyggere, vil prosjektet jobbe for innbyggerens medvirkning og tilfredshet.

I tillegg vil prosjektet jobbe med tiltak for å bidra innenfor følgende hovedsatsnings områdene i handlingsdelen:

- Bo i eget hjem hele livet
- Inkludere alle i arbeid og aktivitet
- Brukermedvirkning
- Rettbruk av kompetanse

Ressurser / organisering

Det er opprettet styringsgruppe, referansegruppe og arbeidsgrupper, som bidrar til fremdrift og beslutninger i prosjektet.

Ledere og fagrådgivere i P05, tillitsvalgte, verneombud HSO, samt representanter fra Tjenestetildeling, Boligtjenesten, Plan og strategi og Utvikling og digitalisering bidrar på forskjellige arenaer i hele prosjektperioden. Medvirkning av brukere, pårørende og organisasjoner vil skje ved deltagelse og arbeid i konkrete arbeidsgrupper og referansegrupper.

Prosjektet gjennomføres innenfor gjeldende budsjett for programområde 05.

Hovedprodukter i prosjektet:

- *Utvikle nye boformer / konsepter*
- *Tjenesteutvikling - Tidlig innsats*
- *Utviklet varige former for medvirkning*
- *Samhandling på tvers i kommunen*
- *Utvikle nye nøkkeltall*

Status



- Gjennomført medvirkningssamarbeidsmøte (14.mars), med representanter fra brukerorganisasjoner, pårørende og brukere
- Utarbeidet styringsdokument, prosjekt- og aktivitetsplan, medvirkningsstrategi og -plan
- Oppdatert interessentanalysen og kommunikasjonsplanen
- Prosjektet er godt i gang med flere av arbeidsgruppene, der medvirkning av brukere og pårørende fremover er en viktig å få involvert korrekt.
- De første arbeidsgruppene er startet
- Samarbeide med prosjektet «Fremtidsrettet tjenestetildeling»



Start:
Desember 2022


Juli 2023

Desember 2023

Slutt:
Juni 2024



Overordnet medvirkningsplan

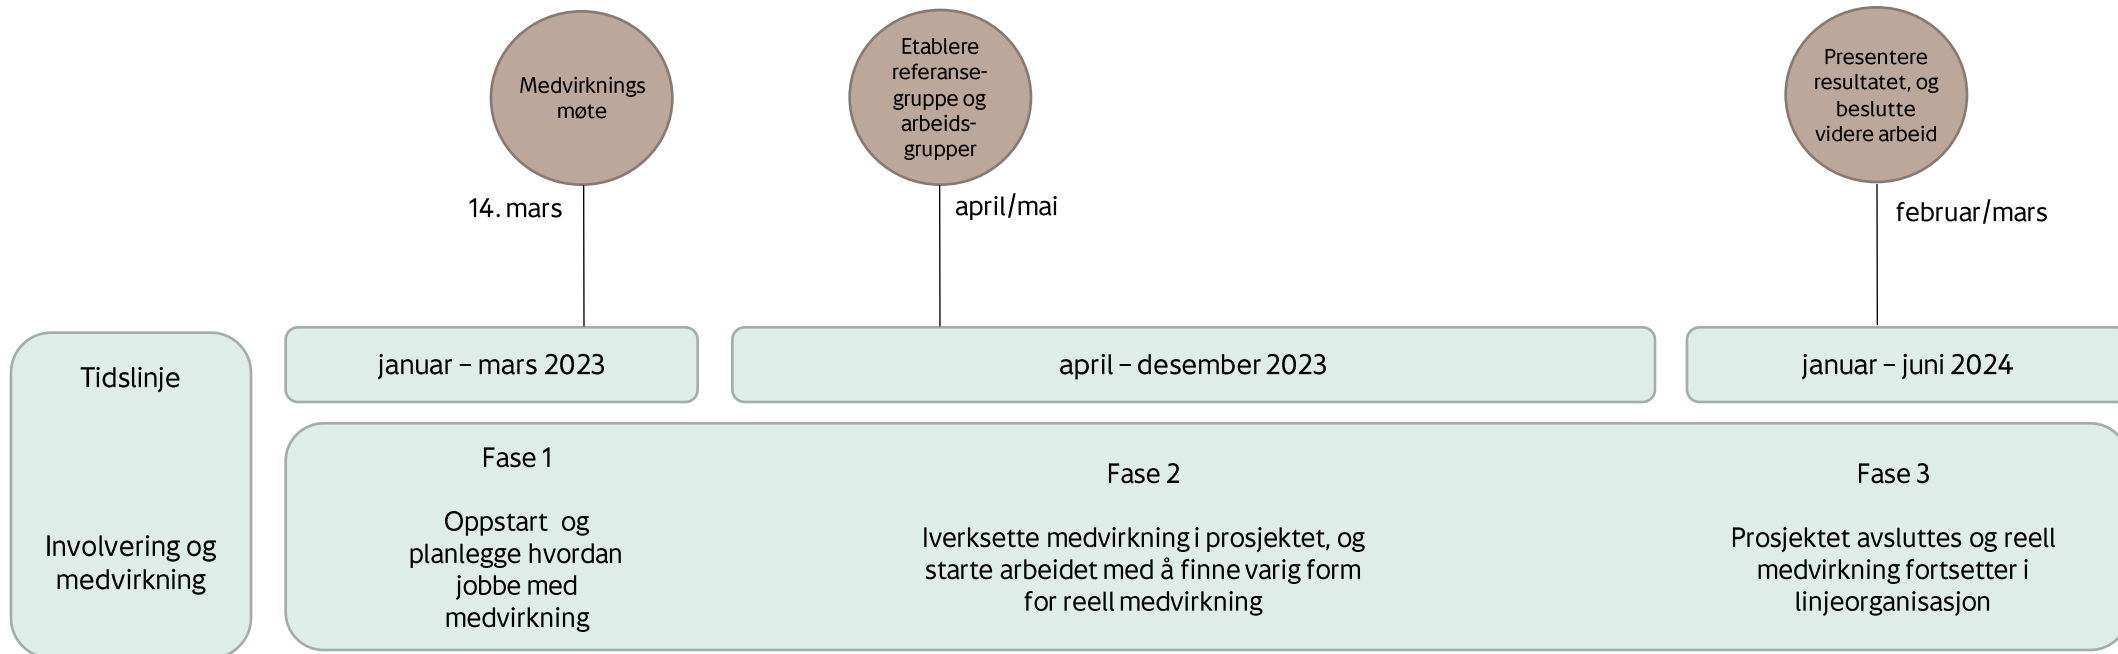

Fremdriftsplan - 2023



| Framdriftsplan | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---------|------|---|---|------|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|----|----|----|-------|-------|----|---|---|------|---|----|----|--------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Januar | | Februar | | | | Mars | | | | | April | | | | | Mai | | | | | Juni | | | | | Juli | | | | August | | | | | | | | | | |
| Hovedområde / arbeidsgruppe | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | # | # | # | # | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | | | | | | |
| Milepæler (BPx og Mx) | | | | bp2 | | | | | | | | | m1 | bp3 | m2 | | | | m3 | | | | m4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styringsdokumentasjon | | | | | 9.2. | | | | | | | 30.3. | | 12.4. | | | | | | | | | | 23.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeidsgruppe - Utvikle nøkkeltall og måle | | | | | | | | | | | | 30.3. | | 12.4. | | 27.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeidsgruppe - Kartlegge dagens situasjon (tjenester og boformer) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeidsgruppe - Utvikle tjenestene knyttet til Konnerudparken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeidsgruppe - Velferdsteknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeidsgruppe - Medvirkning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeidsgruppe - Viderte utvikle boformer / konsepter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeidsgruppe - Tidlig innsats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeidsgruppe - samhandling på tvers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medvirkningssamarbeidsmøte | | | | | | | | | | | | 14.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medbestemmelsesmøte P05 | | | | | | | | | | | | | 23.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rådet for personer med funksjonsnedsettelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eldrerådet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utvidet ledermøte P05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hovedutvalg helse, sosial og omsorg (rapportering) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porteføljestyre (Rapportering) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styringsgruppemøter | | | | | 9.2. | | | | | | | | 30.3. | | 12.4. | | 27.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sommerferie



Overordnede milepæler

| Milepæler | Dato | Beskrivelse |
|-------------|-------------------|--|
| <i>bp1</i> | <i>des.22</i> | <i>Beslutte oppstart av prosjekt (konseptfase) med økonomi i kommunestyre</i> |
| <i>bp2</i> | <i>02.02.2023</i> | <i>Beslutte oppstart planleggingsfase</i> |
| <i>bp3</i> | <i>12.04.2023</i> | <i>Beslutte oppstart gjennomføringsfase</i> |
| <i>bp4</i> | <i>01.06.2024</i> | <i>Beslutte å starte avslutningsfase</i> |
| <i>m1.1</i> | <i>12.04.2023</i> | <i>Beslutte fremdriftsplan våren 2023</i> |
| <i>m1.2</i> | <i>12.04.2023</i> | <i>Kvalitetssikre nøkkeltall / indikatorer</i> |
| <i>m2.1</i> | <i>27.04.2023</i> | <i>Informasjon om medvirkningsstrategi og plan</i> |
| <i>m2.2</i> | <i>26.05.2023</i> | <i>Presentere første måling (baseline) på nøkkeltall / indikatorer</i> |
| <i>m3.1</i> | <i>26.05.2023</i> | <i>Informere - Rutine for bestilling av velferdsteknologi er utviklet</i> |
| <i>m3.2</i> | <i>26.05.2023</i> | <i>Presentere kartlegging av dagens tjenester og boformer</i> |
| <i>m4.1</i> | <i>23.06.2023</i> | <i>Presentere hvilke tjenester basen på Konnerudparken skal tilby</i> |
| <i>m4.2</i> | <i>23.06.2023</i> | <i>Beslutte prosjektplan (fremdriftsplan) høsten 2023</i> |
| <i>m5</i> | <i>Høst 2023</i> | <i>Presentere 1. måling av indikator / nøkkeltall opp mot baseline</i> |
| <i>m6.1</i> | <i>Høst 2023</i> | <i>Presentere master bolig- og tjenestetrapp (Fremtidsrettet tjenestetildeling)</i> |
| <i>m6.2</i> | <i>Høst 2023</i> | <i>Presentere de 2 -3 nye boformene / konseptene</i> |
| <i>m7.1</i> | <i>Høst 2023</i> | <i>Presentere 2. måling av indikator / nøkkeltall opp mot baseline</i> |
| <i>m7.2</i> | <i>Høst 2023</i> | <i>Presentere resultat av intervjuer med brukere og pårørende under 18 år. "Hvilke boform og tjenester er ønskelig i fremtiden» (4-8 år frem i tid)</i> |
| <i>m8.1</i> | <i>Høst 2023</i> | <i>Presentere erfaringer far medvirkningsarbeidet så langt</i> |
| <i>m8.2</i> | <i>Høst 2023</i> | <i>Beslutte prosjektplan (fremdriftsplan) våren 2024</i> |



De første arbeidsgruppene er etablert

1. Utarbeide nye nøkkeltall (indikatorer)

- *Oppdraget: «For å følge utviklingen på tjenesteområdet og framdrift i prosjektet, skal det utvikles et sett nye nøkkeltall som beskriver behovsdekning, ressursprioritering og kvalitet i tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune»*

2. Utvikle tjenestene knyttet til Konnerudparken

- *Hensikt: Jobbe med utvikling av tjenester knyttet til den basen som skal etableres i Konnerudparken, og dokumentere ny boform – der Konnerudparken blir et eksempel*

3. Velferdsteknologi

- *Hensikt: Etablere rutine for bestilling av mestring- og trygghetsskapende teknologi (velferdsteknologi)*

4. Dokumentere dagens situasjon

- *Hensikt: Kartlegge, strukturere og dokumentere hvilke tjenester og boformer som tilbys i dag. (Nå-situasjonen)*

5. Medvirkning

- *Hensikt: Jobbe med utforming av medvirknings aktiviteter både i prosjektet og linjeorganisasjonen, for finne varig form for reell medvirkning over tid*



DRAMMEN
KOMMUNE
- et godt sted å leve
